

## HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT WIEN 3, RENNWEG 89B Höhere Abteilung für Informationstechnologie Höhere Abteilung für Mechatronik

Projektnummer:	3R IT	17 06		Wien, im September 2016		
Antrag um Genehmigung	einer Aufgabens	tellung für	die			
		DIPL	OMA	ARBEIT		
Schuljahr:	2016/17 Anzahl Beiblätter: 18					
Thema:				FortiLe	arn	
Aufgabenstellung: Zu entwickeln ist ein Lehrs Endprodukt beinhaltet sow die Fortinet FortiGate und	ohl theoretische	Inputs a	ls auch	n praktische Üb		endet werden soll. Das d soll dazu dienen, Schülern
Kandidatinnen/Kandidaten	:	Klasse	Indivi	d. Betreuung	Un	terschrift Kandidatinnen
Projektleiterin/Projektleiter						
Philipp Tsitsovits		5AX	KUS			
Stellv. Projektleiterin/Proje	ktleiter					
Patrick Holly		5 CN	SDO			
Daniel Soldan		5AX		SDO		
Betreuerinnen/Betreuer:						Unterschrift
Individuelle Betreuung (Ha	uptbetreuung):					
Clemens Kussbach						
Individuelle Betreuung (Hauptbetreuung Stv.):						
Christian Schöndorfer						
Als Diplomarbeit zugelassen Datum Datum						
AV Dr. Gerhard Hager LSI DI Judith				Wessely-k	(irschke	



## **Executive Summary**

### **Objectives**

We want to create a curriculum which teachers can use as a material for their students. In order to gain knowledge about the functions and specifications that are needed to create the curriculum, we will take a deep dive at the FortiGate. The curriculum also contains theoretical inputs as well as practical exercises for students.

#### **Risks**

Our biggest Risk is the failure to comply with the deadlines. In order to get our arrangements done in time we are going to measure and calculate our progress continuously to highlight how much time and resources will be longer needed.

Our second biggest Risk is the Fortinet software. Problems with the usability of the software, bugs, an update-fail or issues because of no knowledge could occur. In order to be prepared we will be informed appropriate with the main specifications of the software and we will also ask our teachers if we are stuck. In addition, we are going to make backups in case to restore older versions.

### **Milestones** (Table of the most important milestones)

Date	Milestone
2.11.2016	Done doing the exercises & finished to sketch our curriculum exercises.
23.11.2016	Done creating the curriculum exercises.
4.01.2017	Done writing the diploma book.

## **Budget and Resources**

The software we will use is Microsoft Office365 and Asana.

The hardware we will use are Cisco Switches & Router as well as the Fortinet FortiGate.

The HTL Rennweg and Fortinet are both hardware and software costs in this project.

Project budget	€ 0,00
Costs for school	€0
Total man hours	546 h.

Diplomarbeit Antrag Seite 2 von 18



## Inhaltsverzeichnis

1	PR	OJEKTIDEE	4
	1.1	AUSGANGSSITUATION	4
	1.2	BESCHREIBUNG DER İDEE	4
2	PR	OJEKTZIELE	4
_	2.1	HAUPTZIELE	
	2.2	OPTIONALE ZIELE	
	2.3	NICHT ZIELE	6
	2.4	INDIVIDUELLE AUFGABENSTELLUNGEN DER TEAMMITGLIEDER IM GESAMTPROJEKT	7
3	PR	OJEKTORGANISATION	8
	3.1	GRAFISCHE DARSTELLUNG (EMPOWERED PROJEKTORGANISATION)	
	3.2	PROJEKTTEAM	
4	PR	OJEKTUMFELDANALYSE	9
-	4.1	GRAFISCHE DARSTELLUNG	
	4.2	BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN UMFELDER	
5	RIS	SIKOANALYSE	11
J	5.1	BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN RISIKEN	
	5.2	RISIKOPORTFOLIO	
	5.3	RISIKO GEGENMAßNAHMEN	
6	N/I E	ILENSTEINLISTE	11
7		OJEKTRESSOURCEN	
	7.1	PROJEKTRESSOURCEN: SOLL – IST VERGLEICH	
	7.2	PERSONELLE RESSOURCEN	
	7.3	BUDGET	16
8	GE	PLANTE EXTERNE KOOPERATIONSPARTNER	17
0	GE	DI ANTE VEDWEDTING DED EDGEDNISSE	10



## 1 Projektidee

#### 1.1 Ausgangssituation

Fortinet ist ein führender Anbieter für Firewall Sicherheitslösungen. Allerdings verfügt Fortinet nicht über ein Lehrskriptum, welches als einfache Unterrichtsgrundlage für Lehrer verwendet werden kann.

#### 1.2 Beschreibung der Idee

Die Idee ist es, ein Material für Lehrer und Schüler herzstellen. Dazu werden wir uns zuerst theoretisches sowie praktisches Wissen über die FortiGate, welches unser Arbeitsgerät sein wird, aneignen. Das hierbei erlangte Know-how soll dann eingesetzt werden um unser Endprodukt zu erzeugen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Aufbereitung sowohl praktischer Übungen als auch Übungsangaben. Diese sollen innerhalb einer 4 stündigen Laboreinheit durchführbar sein. Ausserdem wird eine Einführung sowie eine Begriffserklärung erstellt. Als Grundlage wird hierbei der Studentsguide von Fortinet genutzt. Optional wird das erlangte Wissen eingesetzt um die Fortinet Zertifizierung des Levels NS4 abzuschließen.

Diplomarbeit Antrag Seite 4 von 18



## 2 Projektziele

#### 2.1 Hauptziele

#### RE-M 1 Übungen erledigen

Die Übungen des FortiGate Students Guides sind durchgeführt worden und werden als Lerngrundlage benutzt.

### RE-M 2 Kurrikulum und dessen Übungsansätze skizzieren

Das Kurrikulum, welches diverse Übungen für Schüler beinhaltet ist skizziert worden und dient als Grundlage für einzelnen Übungen.

#### RE-M 3 Laborübungen erstellen

Es sind Laborübungen für Schüler anhand des Studentsguide erstellt worden. Diese wurden getestet und dokumentiert. Die Übungen sind für Schülergruppen innerhalb einer Laboreinheit durchführbar.

#### RE-M 4 FortiLearn Skriptum als Lehrmaterial

Ein komprimiertes Unterrichtsskriptum für Lehrer ist geschrieben worden. Dieser umfasst eine Einführung in die Fortinet Firewall Thematik sowie die Beschreibung der Laborübungen und der Musterlösungen. Die Zielgruppe richtet sich dabei auf die dritte und vierte Schulstufe der HTL Rennweg.

Diplomarbeit Antrag Seite 5 von 18



#### 2.2 Optionale Ziele

Auflistung der einzelnen Ziele als Zustand, Beschreibung inklusive Lösungsansatz.

RE-O 1 Fortinet Zertifizierung

Es ist eine Zertifizierung des Fortinet Zertifikates vom Level NSE4 abgeschlossen worden.

RE-O 2 Testlauf einer Laborübung

Laborübungen sind von Schülern umfangreich getestet worden.

#### 2.3 NICHT Ziele

RE-N 1 Zertifizierung

Das erzeugte Produkt dient dazu die Zertifizierung von Fortinet abzuschließen.

Diplomarbeit Antrag Seite 6 von 18



## 2.4 Individuelle Aufgabenstellungen der Teammitglieder im Gesamtprojekt

## 2.4.1 Philipp Tsitsovits

Themenschwerpunkt	Ausarbeitung der Themen SSL VPN und Basic IPSEC VPN
Aufgabenstellung  Auflistung der einzelnen Ziele und Anforderungen	<ul> <li>ZIEL-H 1 Durchführen von Übungen</li> <li>ZIEL-H 2 Erstellen von Laborübungen</li> <li>ZIEL-H 3 Ausreichend intensive Auseinandersetzung mit den Themenschwepunkten</li> <li>ZIEL-H 4 Projektleitung</li> </ul>

### 2.4.2 Patrick Holly

Themenschwerpunkt	Ausarbeitung der Themen IPS Systeme und Data Leak Prevention
Aufgabenstellung  Auflistung der einzelnen Ziele und Anforderungen	<ul> <li>ZIEL-H 1 Durchführen von Übungen</li> <li>ZIEL-H 2 Erstellen von Laborübungen</li> <li>ZIEL-H 3 Ausreichend intensive Auseinandersetzung mit den Themenschwepunkten</li> </ul>

#### 2.4.3 Daniel Soldan


Themenschwerpunkt	Ausarbeitung der Themen Firewall Policies und FSSO
Aufgabenstellung  Auflistung der einzelnen Ziele und Anforderungen	<ul> <li>ZIEL-H 1 Durchführen von Übungen</li> <li>ZIEL-H 2 Erstellen von Laborübungen</li> <li>ZIEL-H 3 Ausreichend intensive Auseinandersetzung mit den Themenschwepunkten</li> </ul>

Diplomarbeit Antrag Seite 7 von 18



# 3 Projektorganisation

## 3.1 Grafische Darstellung (Empowered Projektorganisation)

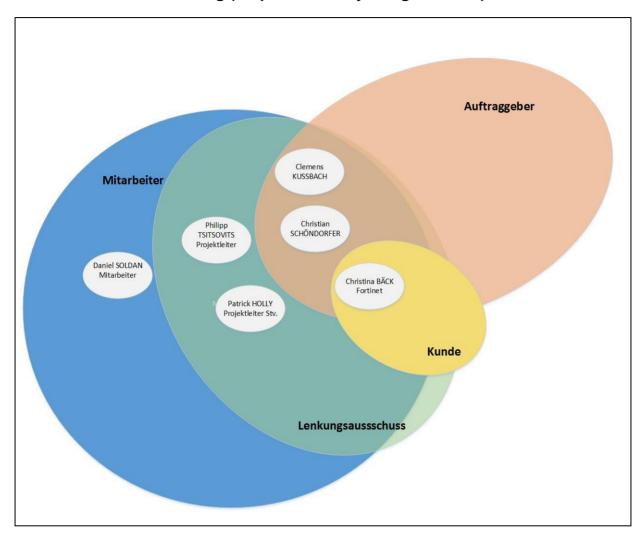

#### 3.2 Projektteam


Funktion	Name	Kürzel	E-Mail
PA	Christian Schöndorfer	SDO	sdo@htl.rennweg.at
PA	Clemens Kussbach	KUS	kus@htl.rennweg.at
PL	Philipp Tsitsovits	TSI	ptsitso@gmail.com
PTM	Patrick Holly	HOL	Patrickh96@aon.at
PTM	Daniel Soldan	SOL	Daniel.soldan@gmx.at
Kunde	Christina BÄCK	FORTI	cbaeck@fortinet.com

Diplomarbeit Antrag Seite 8 von 18



# 4 Projektumfeldanalyse

## 4.1 Grafische Darstellung

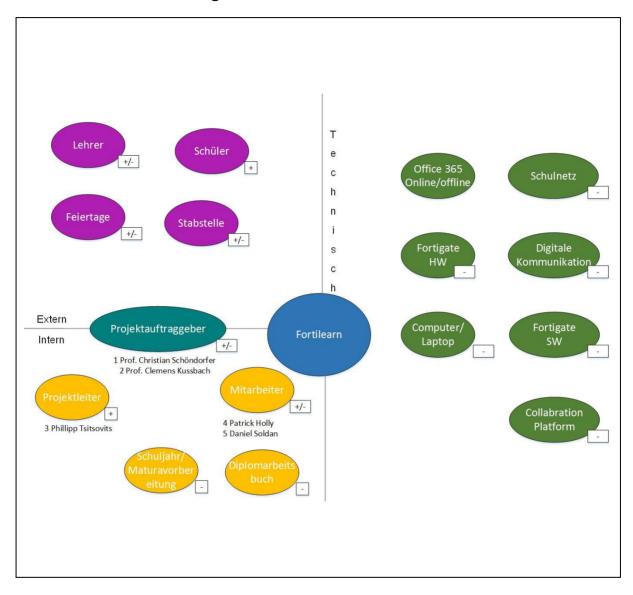

Diplomarbeit Antrag Seite 9 von 18



# 4.2 Beschreibung der wichtigsten Umfelder

#	Bezeichnung	Beschreibung	Bewertung
1	Projektleiter	Koordiniert, organisiert und unterstützt das Projektteam.	+
2	Mitarbeiter	Arbeiten unterstützend und engagiert im Projekt.	+
3	Lehrer	Setzen ihr Wissen gezielt ein um das Projektteam bei Fragen zu unterstützen.	+
4	Schüler	Sind die Zielgruppe des Projektes.	+

Diplomarbeit Antrag Seite 10 von 18



# 5 Risikoanalyse

## 5.1 Beschreibung der wichtigsten Risiken


#	Bezeichnung	Beschreibung des Risikos	Р	А	RF
1	Deadlines	Deadlines werden nicht eingehalten.	25	50	1250
2	Fortigate Software	Arbeiten mit einer komplexen Software.	30	40	1200
3	Datensicherung	Bei keinem regelmäßigen Backup der Daten droht ein Datenverlust.	35	30	1050

P...Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos A...Schadensausmaß bei Eintritt des Risikos RF...berechneter Risikofaktor

Diplomarbeit Antrag Seite 11 von 18



## 5.2 Risikoportfolio

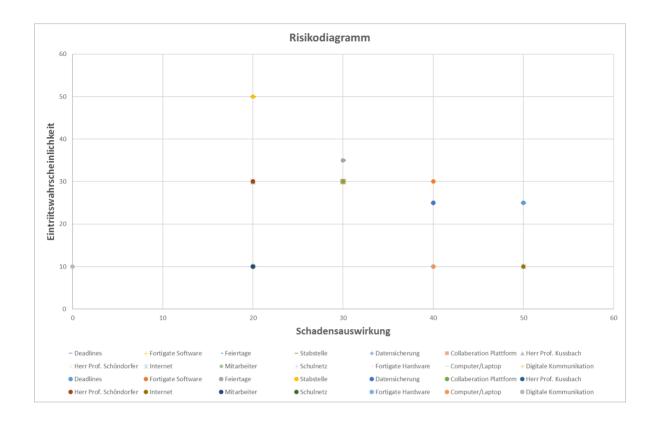

X-Achse...Schadensauswirkung Y-Achse...Eintrittswahrscheinlichkeit

Diplomarbeit Antrag Seite 12 von 18



# 5.3 Risiko Gegenmaßnahmen

#	Bezeichnung	Gegenmaßnahme
1	Deadlines	Pufferzeit vorsehen und immer wieder den aktuellen Fortschritt messen und kalkulieren um zu sehen wieviel Zeit/Ressourcen noch benötigt werden.
2	Fortigate Software	Bei fehlendem know-how wird umgehend die Stabstelle kontaktiert
3	Stabstelle	Abklärung mit Professor Schöndorfer.
4	Datensicherung	Daten regelmäßig sichern.
5	Kollaboration Plattform	Einführungsmeeting planen.
6	Herr Prof. Kussbach	Durch SMARTe Zielsetzung und frühe Terminvereinbarung gedenken wir mehr Unterstützung zu erhalten.
7	Herr Prof. Schöndorfer	Durch SMARTe Zielsetzung und frühe Terminvereinbarung gedenken wir mehr Unterstützung zu erhalten.
8	Internet	Hotspot bereithalten.
9	Mitarbeiter	Mit regelmäßigen Erinnerungen, Notifications und Routinemeetings wird für die Einhaltung von Terminen gesorgt.
10	Schulnetz	Hotspot vorbereiten, USB Stick mitbringen
11	Fortigate Hardware	Vorsichtiger Umgang/Transport. Hardware wird im Spind eingesperrt.
12	Computer/Laptop	Einschulungsmeeting der zu verwendenden Programme planen. Schulcomputer verwenden.
13	Digitale Kommunikation	Alternative Dienste bereithalten.
14	Feirtage	Feirtage planen um den Zeitplan trotzdem beizubehalten.

Diplomarbeit Antrag Seite 13 von 18



# 6 Meilensteinliste

Darstellung der Meilensteine mit geschätzten Terminen

Datum	Meilenstein
16.09.2016	Abgabe des Diplomantrags
12.102016	Fertigstellung von Sprint 1 – Schwerpunkt: FortiGate kennenlernen
14.12.2016	Fertigstellung von Sprint 4 - Schwerpunkt: Übungen erledigen. Angaben/Kurrikulum skizzieren
4.1.2017	Fertigstellung von Sprint 7 - Schwerpunkt: Praktische Übungen/Kurrikulum erstellen
15.2.2017	Fertigstellung von Sprint 8 & 9 - Schwerpunkt: Praktische Übungen feinschleifen & die Theorie dazu erstellen
8.3.2017	Diplomarbeitsbuch ist erstellt.
3.04.2017	Ende der Diplomarbeit

Diplomarbeit Antrag Seite 14 von 18



# 7 Projektressourcen

#### 7.1 Projektressourcen: Soll – Ist Vergleich

Beim Soll-Ist Vergleich wird eruiert, welche Ressourcen (Infrastruktur, Hardware, Software, Know How, Experten,...) vorhanden sind. Falls nicht ausreichend vorhanden, hat dies Auswirkungen auf die Risikoanalyse und/oder auf die Arbeitspakete des Projektstrukturplans. Arten von Ressourcen: Software, Hardware, Infrastruktur, Know How

SOLL Bereich	IST	Risiko (X)
Know How über die FortiGate	(noch) nicht ausreichend	X
Know How über Firewall Systeme	nicht ausreichend	х
Know How zur Erstellung eines Diplomarbeitsbuches	nicht ausreichend	
Know How über Office	ausreichend	
Know How im Bereich Projektmanagement	ausreichend	
Infrastruktur Cisco Labor der Schule	ausreichend	

#### 7.2 Personelle Ressourcen

#	Teammitglied	Personenstunden	
1	Philipp Tsitsovits	182	
2	Patrick Holly	182	
3	Daniel Soldan	182	
4	Kontaktperson von Fortinet	50	
SUMME		596	

Diplomarbeit Antrag Seite 15 von 18



## Höhere Abteilung für Informationstechnologie und Mechatronik Höhere Technische Bundeslehranstalt Wien 3, Rennweg 89b, A -1030 Wien

### 7.3 Budget

## 7.3.1 Auflistung der Aufwände für die Durchführung der Diplomarbeit

Pos.	Bezeichnung des Aufwands	Kosten	Kummuliert
	Gesamtkosten		

### 7.3.2 Kostendeckung

Die Kostendeckung der Hardware und der personellen Ressourcen übernimmt die HTL Rennweg sowie Fortinet.

Diplomarbeit Antrag Seite 16 von 18



# 8 Geplante externe Kooperationspartner

Unser geplanter externer Kooperationspartner ist Fortinet Austria (<a href="http://de.fortinet.com">http://de.fortinet.com</a>). Fortinet stellt uns einen ihrer Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung du übernimmt möglich anfallende Kosten.

Diplomarbeit Antrag Seite 17 von 18



# 9 Geplante Verwertung der Ergebnisse

Nach Abschluss der Diplomarbeit soll das Endprodukt genutzt werden um als Lehrgrundlage an der HTL Rennweg zu dienen. Dabei sollen die Übungen von Schülern im Labor nachgebaut und abgeschlossen werden.

Diplomarbeit Antrag Seite 18 von 18
